


Nº	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Realización	Horarios de las reuniones
1	Proceso de Instalación INFOMEX Nuevo Leon	173 días	lun 18/09/06	mar 05/06/07		
2	Generación de Mapa de Procesos Locales	25 días	lun 18/09/06	vie 20/10/06		
3	Inducción	4 días	lun 18/09/06	jue 21/09/06	Facilitador	
4	Estudio de la Ley de Transparencia Local	3 días	lun 18/09/06	mie 20/09/06		
5	Identificación de formatos de procesos	3 días	lun 18/09/06	mie 20/09/06		
6	Solicitud de Información	3 días	lun 18/09/06	mie 20/09/06		
7	Recurso de Revisión	3 días	lun 18/09/06	mie 20/09/06		
8	Solicitud de Positiva foto	3 días	lun 18/09/06	mie 20/09/06		
9	Recursos de Reconsideración	3 días	lun 18/09/06	mie 20/09/06		
10	Identificación de plazos por proceso	3 días	lun 18/09/06	mie 20/09/06		
11	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	jue 21/09/06	jue 21/09/06	4	
12	Carta y Mapa de procesos locales	21 días	vie 22/09/06	vie 20/10/06	11	
13	Generación de Procesos	20 días	vie 22/09/06	jue 19/10/06		
14	Construcción	20 días	vie 22/09/06	jue 19/10/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	
15	Asesoría técnica	6 días	vie 22/09/06	jue 19/10/06	Facilitador	
16	Entrega de procesos	2 días	lun 02/10/06	vie 13/10/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	
17	Revisión técnica de procesos	2 días	mar 03/10/06	mar 17/10/06	Facilitador	
18	Actualización de procesos	4 días	jue 05/10/06	jue 19/10/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	
19	Liberación de procesos	1 día	vie 20/10/06	vie 20/10/06	18	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
20	Generación de Insumos INFOMEX Local	16 días	vie 22/09/06	vie 13/10/06	11	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
21	Catálogos	16 días	vie 22/09/06	mar 13/10/06		
22	Definición	1 sem	vie 22/09/06	jue 28/09/06		
23	Generación	2 sem.	vie 29/09/06	jue 12/10/06	22	
24	Entrega	1 día	vie 13/10/06	vie 13/10/06	23	
25	Formatos	16 días	vie 22/09/06	vie 13/10/06		
26	Definición	1 sem	vie 22/09/06	jue 28/09/06		
27	Generación	2 sem.	vie 29/09/06	jue 12/10/06	26	
28	Entrega	1 día	vie 13/10/06	vie 13/10/06	27	
29	Acuses	16 días	vie 22/09/06	vie 13/10/06		
30	Definición	1 sem	vie 22/09/06	jue 28/09/06		
31	Generación	2 sem.	vie 29/09/06	jue 12/10/06	30	
32	Entrega	1 día	vie 13/10/06	vie 13/10/06	31	
33	Taller	5 días	lun 23/10/06	vie 27/10/06		
34	Taller sobre el uso de INFOMEX	5 días	lun 23/10/06	vie 27/10/06	19	
35	Capacitación sobre la herramienta	3 días	lun 23/10/06	mie 25/10/06	Facilitador	
36	Construcción de casos de prueba sobre procesos locales	2 días	jue 26/10/06	vie 27/10/06	35	
37	Construcción	2 días	jue 26/10/06	vie 27/10/06	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)	
38	Asesoría	2 días	jue 26/10/06	vie 27/10/06	Facilitador	
39	Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)	118 días	lun 30/10/06	mar 01/06/07		
40	Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas	74 días	lun 30/10/06	vie 23/02/07	33	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
41	Servidor de Bases de Datos	1 día	lun 30/10/06	lun 30/10/06		
42	Servidor de Aplicaciones	1 día	lun 30/10/06	lun 30/10/06		
43	Carga de Catálogos	1 día	vie 23/02/07	vie 23/02/07		
44	Desarrollos particulares	45 días	lun 11/12/06	lun 26/02/07	19	Equipo desarrollo IFAI
45	Construcción	9 sem.	lun 11/12/06	lun 26/02/07		
46	Desarrollo INFOMEX Local	117 días	mar 31/10/06	mar 01/06/07	40	
47	Construcción de procesos	34 días	mar 31/10/06	vie 15/12/06		
48	Construcción de acuses	73 días	mar 31/10/06	vie 23/02/07		
49	Modificación de interfaz gráfica de INFOMEX Local	117 días	mar 31/10/06	mar 01/06/07		
50	Construcción	89 días	mar 31/10/06	mar 20/03/07		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
51	Actualizaciones	89 días	mar 31/10/06	mar 20/03/07		Equipo desarrollo IFAI(27%)
52	Asesoría	89 días	mar 31/10/06	mar 20/03/07		Facilitador(37%)
53	Capacitación al Administrador de INFOMEX Local	2 días	mie 21/03/07	jue 22/03/07	64	Facilitador
54	Capacitación	2 días	mie 21/03/07	jue 22/03/07		
55	Administración de usuarios	2 días	mie 21/03/07	jue 22/03/07		
56	Administración de procesos	2 días	mie 21/03/07	jue 22/03/07		
57	Administración de calendarios	2 días	mie 21/03/07	jue 22/03/07		
58	Administración de interfaz	2 días	mie 21/03/07	jue 22/03/07		



Nº	Nombre de tarea	Duracion	Comienzo	Fin	Precedencia	Nombre de la resource
70	Integración de INFOMEX Local	23 dias	vie 23/03/07	jue 26/04/07	70	Usuario (Entidad/Municipio)
71	Construcción	23 dias	vie 23/03/07	jue 26/04/07		Usuario (Entidad/Municipio)
72	Asesoría	23 dias	vie 23/03/07	jue 26/04/07		Facilitador
73	Pruebas internas en entornos de desarrollo	3 dias	vie 27/04/07	mar 01/05/07		
74	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 dias	vie 27/04/07	lun 30/04/07		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
75	Corrección de incidencias	1 dia	mar 01/05/07	mar 01/05/07	75	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
76	Asesoría	1 dia	mar 01/05/07	mar 01/05/07	75	Facilitador
77	Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción	8 dias	mié 02/05/07	vie 11/05/07	77	
78	Instalación	1 dia	mié 02/05/07	mié 02/05/07		Usuario (Entidad/Municipio)
79	Configuración	0 dias	vie 11/05/07	vie 11/05/07		Usuario (Entidad/Municipio)
80	Asesoría	0 dias	vie 11/05/07	vie 11/05/07		Facilitador
81	Pruebas internas en entornos de producción	4 dias	lun 14/05/07	jue 17/05/07	78	
82	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 dias	lun 14/05/07	mar 16/05/07		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
83	Corrección de incidencias	2 dias	mié 16/05/07	jue 17/05/07	83	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
84	Asesoría	2 dias	mié 16/05/07	jue 17/05/07	83	Facilitador
85	Capacitación al usuario final	10 dias	vie 18/05/07	jue 31/05/07	82	
86	Capacitación INFOMEX Local	8 dias	vie 18/05/07	mar 28/05/07	82	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
87	Generación de Manuales de INFOMEX Local	6 dias	vie 18/05/07	vie 25/05/07	66	
88	Capacitación	2 dias	lun 28/05/07	mar 28/05/07	88	
89	Capacitación a Sujetos Obligados	2 dias	mié 30/05/07	jue 31/05/07	89	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
90	Prueba piloto con Sujetos Obligados	3 dias	vie 01/06/07	mar 06/06/07	90	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
91	Selección de grupo de prueba	1 dia	vie 01/06/07	vie 01/06/07		
92	Pruebas de INFOMEX Local	2 dias	lun 04/06/07	mar 06/06/07	92	
93	Reinicio de Bases de Datos	1 dia	vie 01/06/07	vie 01/06/07		
94	Liberación de INFOMEX Local	1 dia	lun 04/06/07	lun 04/06/07	94	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)

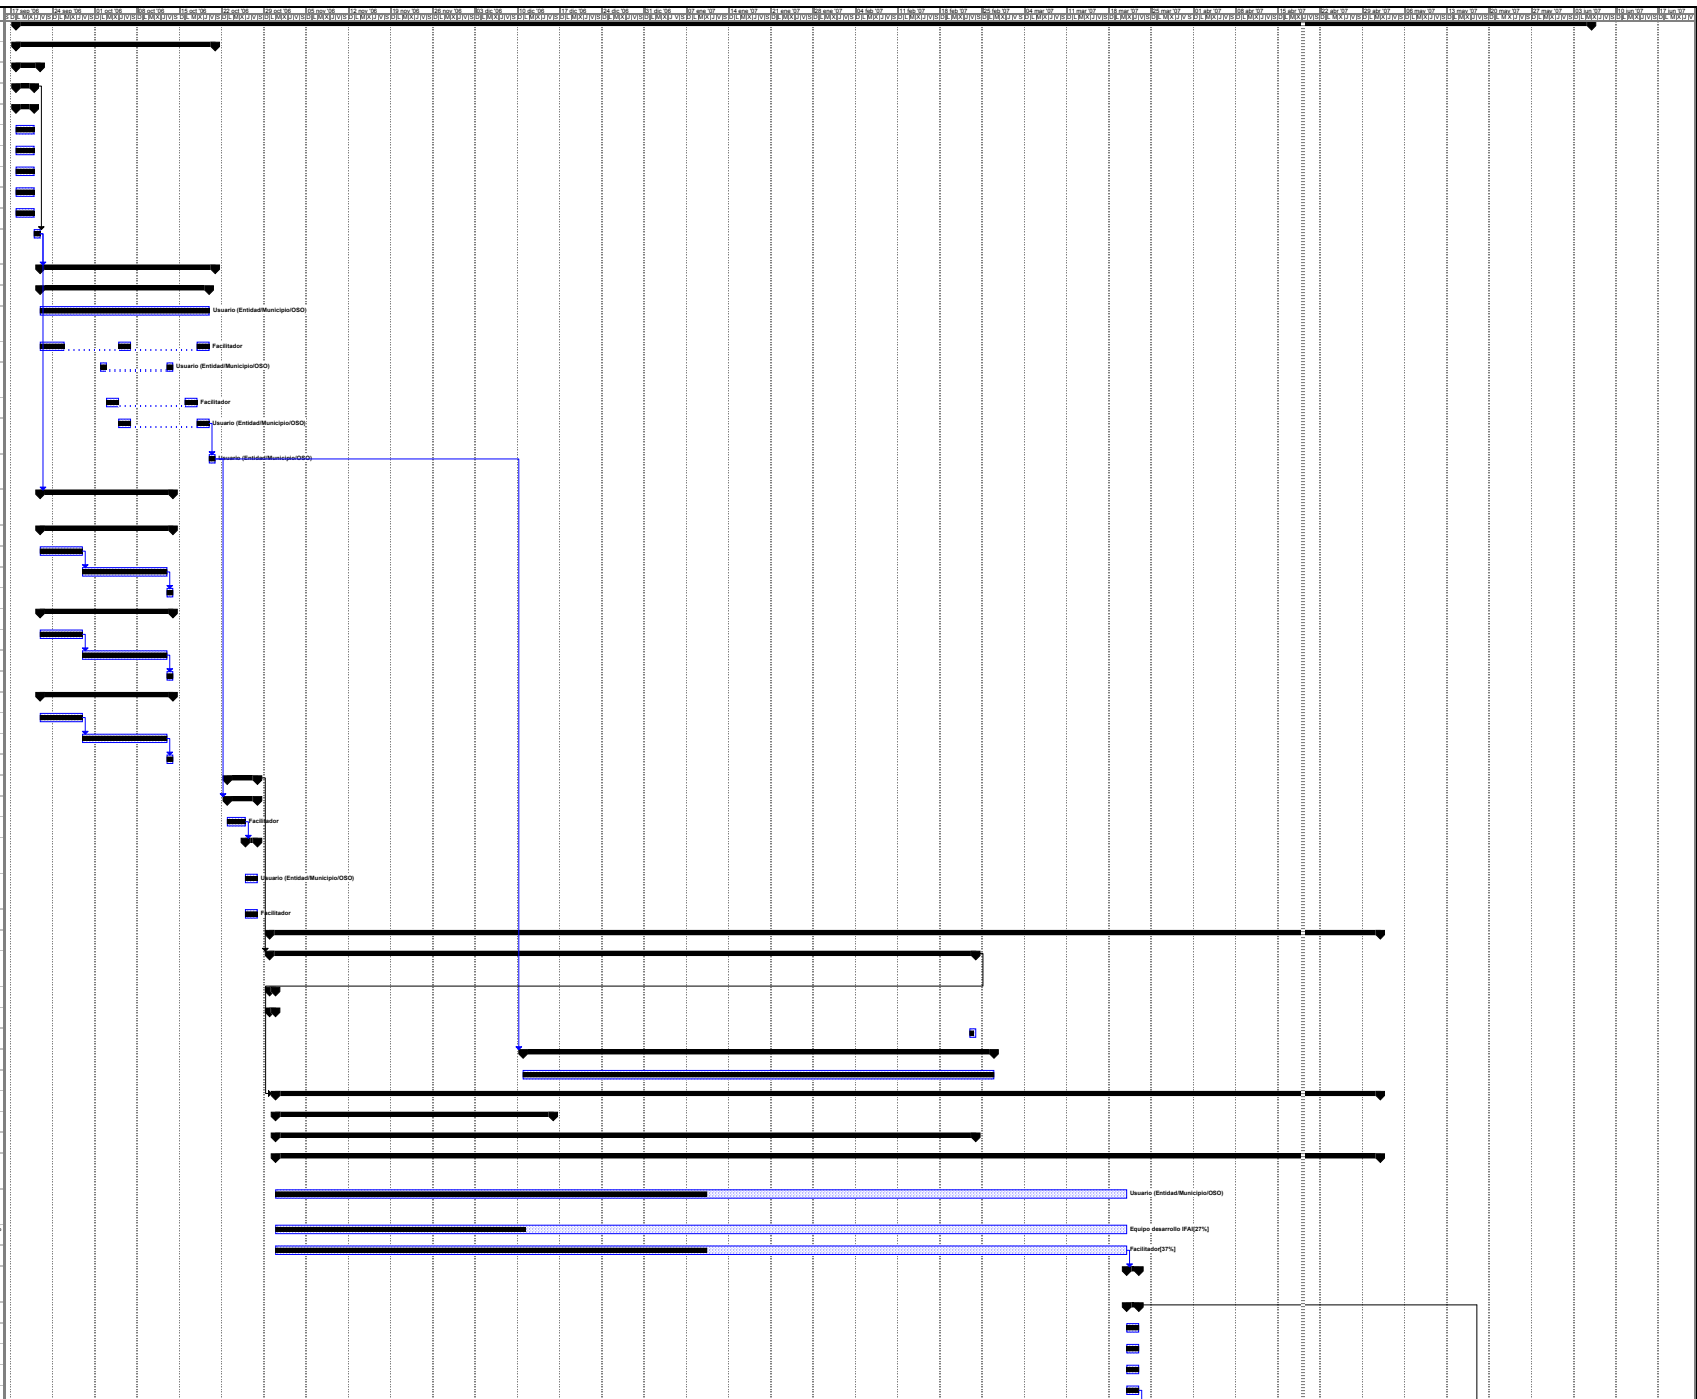
