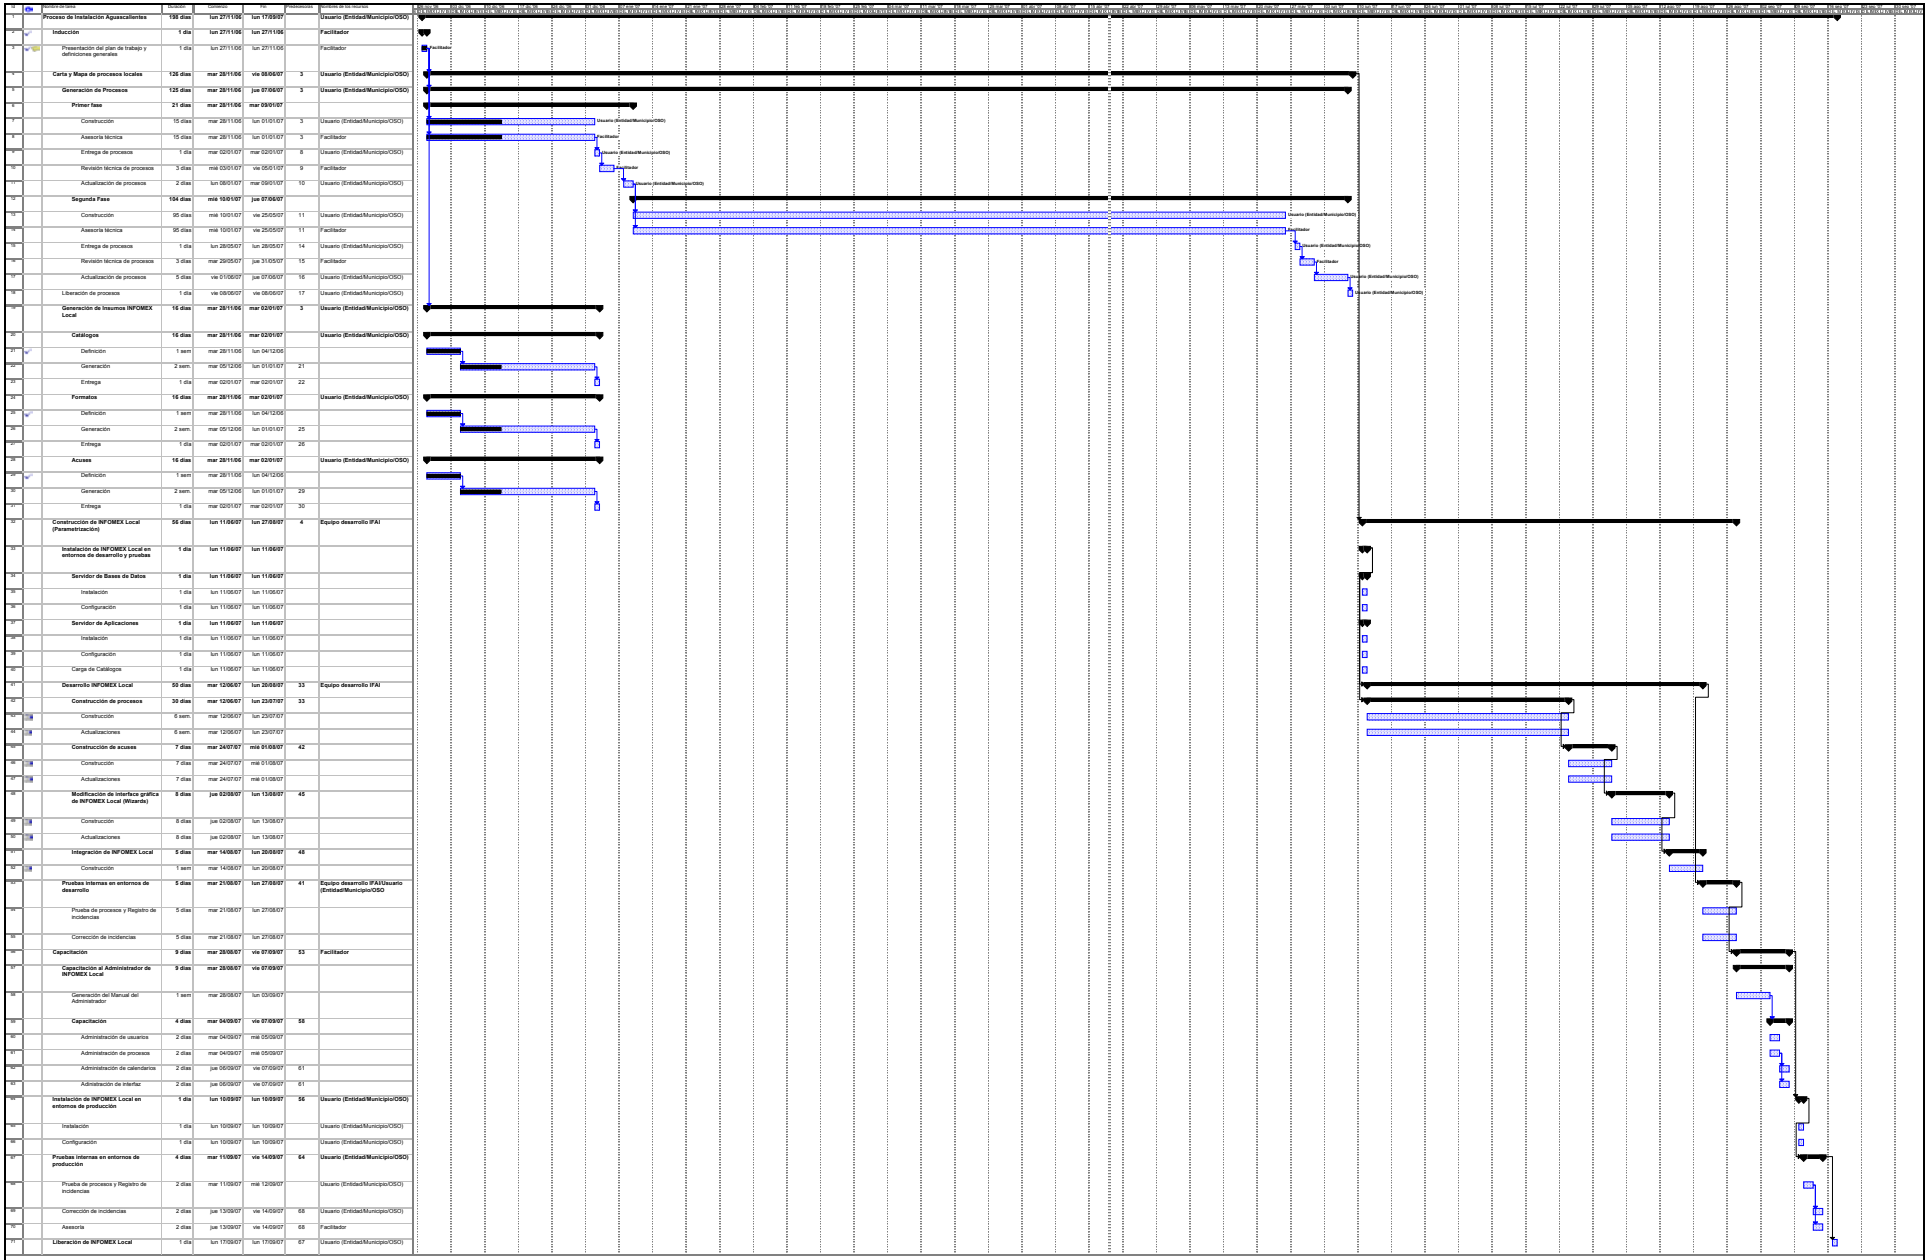

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1	**Proceso de Instalación Aguascalientes**	**150 días**	**lun 27/11/06**	**lun 17/09/07**		**Usuario (Entidad/Municipio/OSO)**
2	**Inducción**	**1 día**	**lun 27/11/06**	**lun 27/11/06**		**Facilitador**
3	Presentación del plan de trabajo y definiciones generales	1 día	lun 27/11/06	lun 27/11/06		Facilitador
4	**Carta y Mapa de procesos locales**	**126 días**	**mar 28/11/06**	**vie 08/06/07**	**3**	**Usuario (Entidad/Municipio/OSO)**
5	**Generación de Procesos**	**125 días**	**mar 28/11/06**	**jue 07/06/07**	**3**	**Usuario (Entidad/Municipio/OSO)**
6	**Primer fase**	**21 días**	**mar 28/11/06**	**mar 09/01/07**		
7	Construcción	15 días	mar 28/11/06	lun 01/01/07	3	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
8	Asesoría técnica	15 días	mar 28/11/06	lun 01/01/07	3	Facilitador
9	Entrega de procesos	1 día	mar 02/01/07	mar 02/01/07	8	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
10	Revisión técnica de procesos	3 días	mié 03/01/07	vie 05/01/07	9	Facilitador
11	Actualización de procesos	2 días	lun 08/01/07	mar 09/01/07	10	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
12	**Segunda Fase**	**104 días**	**mié 10/01/07**	**jue 07/06/07**		
13	Construcción	95 días	mié 10/01/07	vie 25/05/07	11	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
14	Asesoría técnica	95 días	mié 10/01/07	vie 25/05/07	11	Facilitador
15	Entrega de procesos	1 día	lun 28/05/07	lun 28/05/07	14	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
16	Revisión técnica de procesos	3 días	mar 29/05/07	jue 31/05/07	15	Facilitador
17	Actualización de procesos	5 días	vie 01/06/07	jue 07/06/07	16	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
18	Liberación de procesos	1 día	vie 08/06/07	vie 08/06/07	17	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
19	**Generación de Insumos INFOMEX Local**	**16 días**	**mar 28/11/06**	**mar 02/01/07**	**3**	**Usuario (Entidad/Municipio/OSO)**
20	**Catálogos**	**16 días**	**mar 28/11/06**	**mar 02/01/07**		**Usuario (Entidad/Municipio/OSO)**
21	Definición	1 sem	mar 28/11/06	lun 04/12/06		
22	Generación	2 sem.	mar 05/12/06	lun 01/01/07	21	
23	Entrega	1 día	mar 02/01/07	mar 02/01/07	22	
24	**Formatos**	**16 días**	**mar 28/11/06**	**mar 02/01/07**		**Usuario (Entidad/Municipio/OSO)**
25	Definición	1 sem	mar 28/11/06	lun 04/12/06		
26	Generación	2 sem.	mar 05/12/06	lun 01/01/07	25	
27	Entrega	1 día	mar 02/01/07	mar 02/01/07	26	
28	**Acuses**	**16 días**	**mar 28/11/06**	**mar 02/01/07**		**Usuario (Entidad/Municipio/OSO)**
29	Definición	1 sem	mar 28/11/06	lun 04/12/06		
30	Generación	2 sem.	mar 05/12/06	lun 01/01/07	29	
31	Entrega	1 día	mar 02/01/07	mar 02/01/07	30	
32	**Construcción de INFOMEX Local (Parametrización)**	**56 días**	**lun 11/06/07**	**lun 27/08/07**	**4**	**Equipo desarrollo IFAI**
33	**Instalación de INFOMEX Local en entornos de desarrollo y pruebas**	**1 día**	**lun 11/06/07**	**lun 11/06/07**		
34	**Servidor de Bases de Datos**	**1 día**	**lun 11/06/07**	**lun 11/06/07**		
35	Instalación	1 día	lun 11/06/07	lun 11/06/07		
36	Configuración	1 día	lun 11/06/07	lun 11/06/07		
37	**Servidor de Aplicaciones**	**1 día**	**lun 11/06/07**	**lun 11/06/07**		
38	Instalación	1 día	lun 11/06/07	lun 11/06/07		
39	Configuración	1 día	lun 11/06/07	lun 11/06/07		
40	Carga de Catálogos	1 día	lun 11/06/07	lun 11/06/07		
41	**Desarrollo INFOMEX Local**	**50 días**	**mar 12/06/07**	**lun 20/08/07**	**33**	**Equipo desarrollo IFAI**
42	**Construcción de procesos**	**30 días**	**mar 12/06/07**	**lun 23/07/07**	**33**	
43	Construcción	6 sem.	mar 12/06/07	lun 23/07/07		
44	Actualizaciones	6 sem.	mar 12/06/07	lun 23/07/07		
45	**Construcción de acuses**	**7 días**	**mar 24/07/07**	**mié 01/08/07**	**42**	
46	Construcción	7 días	mar 24/07/07	mié 01/08/07		
47	Actualizaciones	7 días	mar 24/07/07	mié 01/08/07		
48	**Modificación de interface gráfica de INFOMEX Local (Wizards)**	**8 días**	**jue 02/08/07**	**lun 13/08/07**	**45**	
49	Construcción	8 días	jue 02/08/07	lun 13/08/07		
50	Actualizaciones	8 días	jue 02/08/07	lun 13/08/07		
51	**Integración de INFOMEX Local**	**5 días**	**mar 14/08/07**	**lun 20/08/07**	**48**	
52	Construcción	1 sem	mar 14/08/07	lun 20/08/07		
53	**Pruebas internas en entornos de desarrollo**	**5 días**	**mar 21/08/07**	**lun 27/08/07**	**41**	**Equipo desarrollo IFAI/Usuario (Entidad/Municipio/OSO**
54	Prueba de procesos y Registro de incidencias	5 días	mar 21/08/07	lun 27/08/07		
55	Corrección de incidencias	5 días	mar 21/08/07	lun 27/08/07		
56	**Capacitación**	**9 días**	**mar 28/08/07**	**vie 07/09/07**	**53**	**Facilitador**
57	**Capacitación al Administrador de INFOMEX Local**	**9 días**	**mar 28/08/07**	**vie 07/09/07**		
58	Generación del Manual del Administrador	1 sem	mar 28/08/07	lun 03/09/07		
59	**Capacitación**	**4 días**	**mar 04/09/07**	**vie 07/09/07**	**58**	
60	Administración de usuarios	2 días	mar 04/09/07	mié 05/09/07		
61	Administración de procesos	2 días	mar 04/09/07	mié 05/09/07		
62	Administración de calendarios	2 días	jue 06/09/07	vie 07/09/07	61	
63	Administración de interfaz	2 días	jue 06/09/07	vie 07/09/07	61	
64	**Instalación de INFOMEX Local en entornos de producción**	**1 día**	**lun 10/09/07**	**lun 10/09/07**	**56**	**Usuario (Entidad/Municipio/OSO)**
65	Instalación	1 día	lun 10/09/07	lun 10/09/07		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
66	Configuración	1 día	lun 10/09/07	lun 10/09/07		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
67	**Pruebas internas en entornos de producción**	**4 días**	**mar 11/09/07**	**vie 14/09/07**	**64**	**Usuario (Entidad/Municipio/OSO)**
68	Prueba de procesos y Registro de incidencias	2 días	mar 11/09/07	mié 12/09/07		Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
69	Corrección de incidencias	2 días	jue 13/09/07	vie 14/09/07	68	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
70	Asesoría	2 días	jue 13/09/07	vie 14/09/07	68	Facilitador
71	**Liberación de INFOMEX Local**	1 día	lun 17/09/07	lun 17/09/07	67	Usuario (Entidad/Municipio/OSO)
